

Государственное предприятие Кемеровской области
«Центр технической инвентаризации Кемеровской области»
филиал №22 «БТИ г.Юрги»

адрес: Кемеровская обл. г. Юрга, ул. Ленинградская, 46, тел.: 4-18-68, 4-06-60

(почтовый адрес БТИ)

Исх.№

от

07.02.07г.

Выписка из технического паспорта

Кадастровый №

Предыдущий кадастровый №

Почтовый адрес:

г. Юрга ул. Нахановича №50

Наименование:

Гараж

Целевое назначение:

Гаражное

Этажность основного здания:

1

, на этаже

Инвентаризационная стоимость, руб.:

280045

Литера:

A

стены

Кирпичные

Общая площадь, м²:

143.7

Год постройки:

Выписка подготовлена на дату последней инвентаризации:

07.02.07г.

Дополнительные сведения:

Работу выполнил инвентаризатор

Руководитель:



Е.А.

(Чалдушкина Е.А.)

Л.А.

(Давыденко Л.А.)

VI. Описание конструктивных элементов здания

Год постройки		Число этажей		1													
А		Вид внутренней отделки															
капитальности																	
Наименование конструктивных элементов		Описание констр. элементов (материал, отделка, конструкция, и прочее)		Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)		Удельный вес		Попр. к уд. весу		Уд. вес с погр.		Износ в %		% износа к стр.		Текущие изменения износ в %	
2		3		4		5		6		7		8		9		10 11	
Фундаменты		бетонно-ленточный		хорошее		17		1.00		17.0		10		1.7			
Стены, отделка		кирпичные		хорошее								10					
Перегородки						30		1.00		30.0				3.0			
Перекрытия	чердачное																
	междуэтажное	ж/бетонное		хорошее		6		1.00		6.0		10		0.6			
	надподвальное																
Проемы	Крыша	шиферная		хорошее		7		1.00		7.0		20		1.4			
	Полы	бетонные		хорошее		5		1.00		5.0		20		1.0			
	оконные	двойные		хорошее		11		1.00		11.0		20		2.2			
	дверные	ворота		хорошее								20					
Внутренняя отделка		побелено		хорошее		2		1.00		2.0		20		0.4			
Санит. и эл. техн. устройства	отопление																
	водопровод																
	канализация																
	горячее в/снабжение																
	ванны																
	эл.освещение																
	радио																
телефон																	
вентиляция																	
лифты																	
Прочие работы		отмостки		трещины		4		1.00		4.0		25		1.0			
ИТОГО:						100		100.0		18.5							


% износа приведенный к 100 по формуле

$\frac{\text{процент износа (гр.9)*100}}{\text{удельный вес (гр.7)}}$

= 19 %

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

г. Юрга, Александровский пр. в г. Юрга № 50

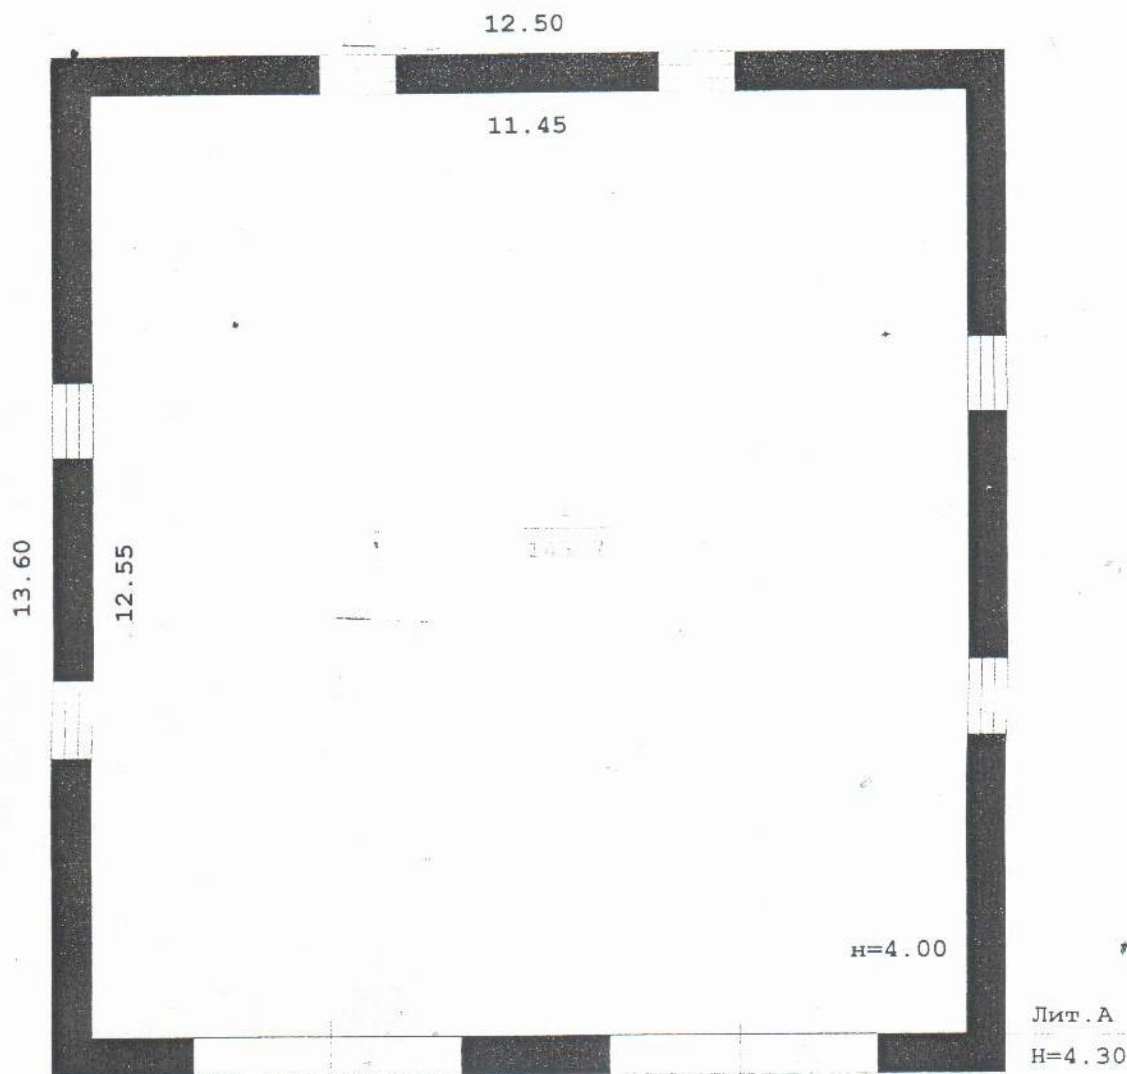

M 1:100

